

臺中市政府「廉能透明獎」公共工程廉能透明機制類申請表

|                      |               |                                                      |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 提案<br>工程<br>基本<br>資料 | 工程名稱          | 臺中市北勢國小104年度新建校舍工程                                   |
|                      | 主辦機關          | 臺中市沙鹿區北勢國民小學                                         |
|                      | 承攬廠商          | 井田營造工程有限公司                                           |
|                      | 設計監造單位        | 張揚東建築師事務所                                            |
|                      | 專案管理單位        | 無                                                    |
|                      | 招標方式          | 公開招標                                                 |
|                      | 招標金額          | 新臺幣9,323萬8,409元                                      |
|                      | 決標方式          | 最低標                                                  |
|                      | 決標金額          | 新臺幣8,692萬元                                           |
|                      | 履約期限及進度       | 履約期限：106年3月16日~107年6月2日<br>進度：107年10月30日已取得使用執照並決算付款 |
|                      | 單位承辦人及主管職稱、姓名 | 臺中市沙鹿區北勢國民小學<br>承辦人：李佳蓉<br>主管：校長王慶祥                  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>提案工程廉能透明機制簡介</p>       | <p>本案工程為新建校舍工程</p> <p>(一) 因本校負責學區內人口數快速成長，加上辦學績效良好，學校年年增班，學校容納學生人數增加，教室嚴重不足，因此校舍不敷使用擴建教室已有急迫性，向教育局提出增設小學教室及幼兒園教室需求，於 104 年擬定本校西北側空地作為本計畫主要興建位置。</p> <p>(二) 為提升整體校舍使用效能於規劃設計階段辦理親師生說明會，避免浪費，符應使用者需求。</p> <p>(三) 為落實招標資訊公開及透明化，於 105 年 11 月 17 日至 11 月 21 日辦理招標預算書圖文件公開閱覽。閱覽期間，無接獲其他廠商及民眾提報意見，遂依規賡續辦理公開招標事宜。</p> <p>(四) 工程執行期間，除將工程相關資訊登載於行政院公共工程委員會網站，以供民眾查詢；亦掌握工程進度及工程預算執行，自 106 年 3 月 16 開工後，校方每日到工地勘察督導，每兩周召開監造會議，對於工程所需文件送審與工序安排積極追蹤，有效進行工程管理。於 107 年 6 月工程如期如質完成，並於同年 10 月 30 取得使用執照落成啟用，給學童一座綠建築城堡。</p> |
| <p>興利防弊管理模式<br/>(20%)</p> | <p>(一) 為了讓新建校舍工程設計更符合師生使用需求，設計之初辦理親師生說明會及都市審議會，確定設計方向與需求，設計結果邀請工程領域專家學者審查設計書圖。(附件3)</p> <p>(二) 因本案基地位處山坡地範圍，將水土保持部分納入評估規劃項目，水土保持計畫亦經過水利局審查通過執行。(附件3)</p> <p>(三) 工程期間每2周由教育局、校方、建築師及承攬廠商召開監造會議，並召開工程進度督導會議，督導工程進度及協調工程中待解決事項。(附件1)</p> <p>(四) 工程施作期間外聘專家學者督導、政風室工程抽查及教育部工程查核，獲取良好成績。(附件1)</p> <p>(五) 工程執行期間落實工程倫理，依約積極督促施工單位及監單位送計畫書及相關書件時程；在施工品質管理、材料進場品質管制、職業安全衛生管理均落實每環節相關規定，讓本工程零工安事故，施工品質無虞有效朝興利防弊管理邁進。</p>                                                                                              |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>推動透明機制相關措施<br/>(32%)</p> | <p>(一)招標流程均依採購法相關規定辦理公開招標。</p> <p>(二)公開閱覽，於政府採購公報公告相關採購資訊。</p> <p>(三)工程招標後辦理開工前協調會，本校發文並協同承攬廠商至學區內議員、村里長辦公室宣導開工。<br/>(附件2)</p> <p>(四)開工前辦理建造執照並取得建照後開工。(附件3)</p> <p>(五)建置工地施工即時監控系統，施工期間全程縮時攝影、拍照並上傳 LINE 群組，以利掌握每日施工狀況及相關事務即時溝通反應。(附件4)</p> <p>(六)嚴格要求監造及施工單位每日將施工過程如實際記載於施工日誌及監造日誌內供機關查閱。(附件5)</p> <p>(七)工程檢驗停留點檢核表、拍照及攝影確實紀錄，供主辦及監督機關備查。(附件6)</p> <p>(八)材料送審過程完整，並報教育局備查。(附件7)</p> <p>(九)督導監造單位適時提供各項抽查驗缺失改善資料給承商，限期完成缺失改善結果複核機制。(附件8)</p> <p>(十)本案附屬公共藝術設置計畫案亦循文化部規定完成設置(附件14)</p> |
| <p>履約效能風險控管機制<br/>(25%)</p> | <p>(一) 本案工程每天均有監造單位於現場督導工程，如遇施工項目有疑慮會即時召開工程協調會即時反應，避免履約爭議、每月定期召開工程督導會議，督導工程進度及協調待解決事項，確保工程如期、如質完工。(附件1)</p> <p>(二) 本工程歷經一次變更設計，期間透過督導會議討論、檢核，讓工程變更項目更符合師生教學使用。<br/>(附件3)</p> <p>(三) 落實臺中市政府所訂品質管理作業相關規範，確實依三級品質管理作業，做好各項自主檢核，相關抽查驗紀錄皆留存書面資料供機關查核。(附件9)</p> <p>(四) 開工前要求施工廠商依照監造計畫提送三大計畫書審查。(附件10)</p> <p>(五) 工程期間估驗計價、竣工驗收付款均依照履約期程規定辦理(附件11)</p>                                                                                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公民參與之程度<br>(15%) | <p>(一)設計階段:親師生及建築師週會宣導參與校舍設計圖研討、召集親師召開校舍規劃會議。(附件3)</p> <p>(二)於工程告示牌公告市民通報專線1999及全民督工服務專線：0800009609，供民眾通報管道監督施工情形，可即時反應施工問題，妥適回應民眾陳情。(附件2)</p> <p>(三)每周朝會跟師生報告工程進度及安全宣導。(附件2)</p> <p>(四)公共藝術完成後，辦理民眾參與，設計導覽手冊讓藝術家與本校師生一同參與。(附件11)</p>                                                                                                                                 |
| 創新創意作為 (8%)      | <p>(一) 本案從規劃設計到執行，希望打造一座全「心」創意的校園。提供親師生能在校園中觀察研究、體驗學習、運動休閒、表演欣賞、散步談心、沉思靜坐等動靜皆宜的活動空間。工程取得使照後，1樓提供幼兒園增班學習，2-4樓國小學童教室，並舉辦全校師生命名票選活動，命名「平等樓」(附件13)</p> <p>(二) 本工程於施工期間放樣及關路配置均長遠考量，健全整體品質與使用上的便利，完工後亦做人員教育訓練，讓本工程生命週期管理維護更加完善。</p> <p>(三) 本工程於施工期間欣逢臺中市政府107年度辦理花博盛事，本校響應市府活動，在施工甲種圍籬噴上花博的標語。(附件13)</p> <p>(四) 取得綠建築標章。(附件13)</p>                                         |
| 相關附件             | <p>附件1、歷次工程進度督導及主管機關查核彙整表</p> <p>附件2、開工預告及工務會議工程施工期間視察照片及工程動土典禮、落成典禮即時新聞佈告</p> <p>附件3、建造執照使用執照、預算書圖審查及變更設計</p> <p>附件4、工地團隊即時聯繫概況</p> <p>附件5、監造日誌、施工日誌</p> <p>附件6、工程檢驗停留點檢核表</p> <p>附件7、材料送審備查資料</p> <p>附件8、抽查驗缺失改善資料</p> <p>附件9、三級品管組織架構表、環安衛、承辦單位督導</p> <p>附件10、職業安全衛生計畫備查函</p> <p>附件11、工程估驗計價、竣工驗收付款情形</p> <p>附件12、公共藝術設計計劃及民眾參與照片</p> <p>附件13、工程圍籬響應花博標語、綠建築標章</p> |
| 聯絡窗口             | <p>姓名：李佳蓉                      電話：26315032#734</p> <p>e-mail：bses1023@bses.tc.edu.tw</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 臺中市政府「廉能透明獎」公共工程廉能透明機制類--機關自主檢核表

| 檢視內容                                                  | 是&否(勾選是請填寫右方欄位)                                                  | 案件事由 | 處理情形 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1. 本案是否曾遭投訴或反映採購作業瑕疵，如綁標、圍標及洩漏採購資訊等情事？                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |      |      |
| 2. 廠商對採購作業及履約事項是否有爭議，提出異議、申訴或申請調解，以致嚴重延宕工程進度？         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |      |      |
| 3. 規劃設計、監造及履約過程是否具有重大違失，如廠商偷工減料、未按圖施工、逾期完工、調換試體等情事？   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |      |      |
| 4. 工程期間是否遭遇嚴重影響機關聲譽之風險，如重大陳抗事件、媒體負面報導或屢遭民眾檢舉、議員質詢等情事？ | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |      |      |
| 5. 工程採購及履約過程是否曾發生遭檢察、調查或廉政等機關調卷、約談、搜索或扣押等狀況？          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |      |      |
| 6. 機關人員及廠商是否有利益輸送、請託關說及飲宴招待或其他不當情事，而涉犯刑事及行政責任？        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |      |      |



## 附件1

### ●督導及受查核情形

#### ● 本局督導小組督導情形

| 項次 | 督導與查核類別        | 次數統計 | 評分    |
|----|----------------|------|-------|
| 1  | 臺中市政府教育局督導小組   | 1次   |       |
| 2  | 臺中市政府工程施工查核小組  | 1次   | 80分甲等 |
| 3  | 教育部工程施工查核小組    | 1次   | 82分甲等 |
| 4  | 臺中市政府政風處       | 1次   |       |
| 5  | 臺中市政府教育局承辦單位督導 | 20次  |       |
|    | 合計             | 24次  |       |



督導小組會議



外聘委員文件督導



外聘委員現場督導



### ●工程查訪結果公文

臺中市政府 函

地址：40701臺中市西屯區臺灣大道三段99號  
承辦人：[REDACTED]  
電話：[REDACTED]  
電子信箱：[REDACTED].tw

受文者：臺中市政府教育局

發文日期：中華民國107年1月9日  
發文字號：府教研字第1070005426號  
類別：普通件  
密等及密級：普通件或秘密期限：  
附件：如主旨(1070005426\_Attach01.xlsx)

主旨：檢送本府「106年度工程施工查核甲等(80分以上)標案一覽表」乙份，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據臺中市政府工程施工查核補充規定辦理。
- 二、旨揭106年度查核評列**甲等(80分以上)**標案，請工程主辦單位依據上開規定辦理領獎事宜：
  - (一)補充規定第十三點第二項規定略以：「(二)工程施工期間查核成績列甲等且達八十五分以上者，嘉獎二次；查核金額以上者，承辦及協辦人員得加發工程獎金新臺幣一萬元；未達查核金額者，承辦及協辦人員得加發工程獎金新臺幣五千元。」
  - (二)補充規定第十三點第三項規定略以：「工程查核成績列為甲等且成績達八十分以上，嘉獎一次。」
- 三、臺中市政府工程施工查核補充規定請至本府法規資料庫查詢下載。

正本：臺中市政府水利局、臺中市政府教育局、臺中市政府文化局、臺中市立清水國民中學、臺中市政府建設局、臺中市立雙十國民中學、臺中市風景區管理處、臺中市政府

第1頁，共2頁

工程查核紀錄 發文：107/01/08  
041070002728 附件

教育部 函

地址：41341臺中市霧峰區中正路738之4號  
承辦人：[REDACTED]  
電話：[REDACTED]  
電子信箱：[REDACTED].tw

受文者：臺中市沙鹿區北勢國民小學

發文日期：中華民國106年12月1日  
發文字號：臺教授國字第106125559號  
類別：普通件  
密等及密級：普通件或秘密期限：  
附件：查核紀錄、工程施工查核改善對策及結果表、工程查核改善對策及追蹤表填寫說明及實例

主旨：檢送本部工程施工查核小組106年10月25日查核實管「臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程」查核紀錄**查核成績82分**1份，請於106年12月1日前將工程缺失改善成果函報本部國教署備查，請查照。

說明：

- 一、依據「工程施工查核小組作業辦法」辦理。
- 二、請貴府主辦單位針對查核紀錄所列缺失督促相關單位確實改善，並將改善情形填寫「工程施工查核改善對策及結果表」，連同改善前、中、後照片裝訂2冊，於規定期限內函報本部國教署備查；填寫、裝訂作業請參照所附「工程查核改善對策及追蹤表填寫說明及實例」。
- 三、貴府主辦單位檢討查核缺失如未能於旨揭期限內全部改善者，請依「工程施工查核小組處理查核缺失改善逾期案件補充規定」，於期限前將已改善完成部分先行回復；無法如期改善部分，請敘明原因，俾利申請展延期限。至於自辦工程品質督導發現之缺點，仍請本權責自行列管追蹤改善。

正本：臺中市政府  
副本：臺中市沙鹿區北勢國民小學、本部秘書處、本部國教署兼前任秘書室、本部國

第1頁，共2頁

## 附件1

### ●歷次主辦機關督導情形統計

| 項次 | 督導單位 | 督導方式   | 督導日期     | 矯正改善完成日期 | 結案日期      | 備註                               |
|----|------|--------|----------|----------|-----------|----------------------------------|
| 1  | 教育局  | 不定時督導  | 106.3.29 | 106.4.17 | 106.4.24  | 督導工地基地開挖前放樣及相關安全措施               |
| 2  | 教育局  | 不定時督導  | 106.4.13 | 無缺失      | 無缺失       | 督導基礎鋼筋綁紮                         |
| 3  | 教育局  | 不定時督導  | 106.4.27 | 106.5.8  | 106.5.10  | 督導工地品質文件及柱位鋼筋綁紮                  |
| 4  | 教育局  | 不定時督導  | 106.5.11 | 106.5.16 | 106.5.19  | 督導工地品質文件                         |
| 5  | 教育局  | 不定時督導  | 106.5.25 | 106.6.6  | 106.6.16  | 督導外伸樑鋼筋                          |
| 6  | 教育局  | 不定時督導  | 106.6.27 | 106.7.4  | 106.7.7   | 督導1樓鋼筋綁紮                         |
| 7  | 教育局  | 不定時督導  | 106.7.6  | 106.7.14 | 106.7.17  | 督導工地現場環境                         |
| 8  | 教育局  | 不定時督導  | 106.7.20 | 106.7.26 | 106.8.2   | 督導1樓柱牆鋼筋綁紮                       |
| 9  | 教育局  | 本局督導小組 | 106.7.26 | 106.8.26 | 106.11.10 | 一樓結構體柱牆鋼筋模板、外部排水設施施工、水保滯洪池設施作業進行 |
| 10 | 教育局  | 不定時督導  | 106.8.10 | 106.8.17 | 106.8.23  | 督導現場安全措施及模板組立                    |

| 項次 | 督導單位 | 督導方式  | 督導日期      | 矯正改善完成日期  | 結案日期      | 備註                  |
|----|------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 11 | 教育局  | 長官督導  | 106.8.24  | 106.8.30  | 106.9.05  | 督導1樓混凝土             |
| 12 | 教育局  | 不定時督導 | 106.9.1   | 106.9.11  | 106.9.13  | 督導1樓混凝土             |
| 13 | 教育局  | 不定時督導 | 106.10.11 | 106.0.16  | 106.0.19  | 督導2F柱牆鋼筋綁紮          |
| 14 | 教育局  | 不定時督導 | 106.11.16 | 106.11.20 | 106.11.23 | 丙梯拆模蜂窩、風雨教室欄杆       |
| 15 | 教育局  | 不定時督導 | 106.11.30 | 106.12.7  | 106.12.13 | 4F牆柱鋼筋施工綁紮,柱牆單面模板施工 |
| 16 | 教育局  | 不定時督導 | 106.12.14 | 無缺失       | 無缺失       | 4F牆封模,屋頂坪頂樑版模板組配施工  |
| 17 | 教育局  | 不定時督導 | 107.01.11 | 107.01.16 | 107.01.19 | 1-2F門窗嵌縫,進場安裝       |
| 18 | 教育局  | 不定時督導 | 107.01.25 | 107.01.29 | 107.02.07 | 督導工地職業衛生安全及樓梯蜂窩     |
| 19 | 教育局  | 不定時督導 | 107.02.8  | 107..2.11 | 107.3.16  | 督導廊道基礎工程            |
| 20 | 教育局  | 不定時督導 | 107.2.27  | 107.3.5   | 107.3.16  | 督導樓層、屋頂防水施作         |
| 21 | 教育局  | 不定時督導 | 107.3.23  | 改善中       | 改善中       | 督導職業安全衛生及貼磚作業       |

## 附件2

### ●至學區立委、議員、里長辦公室發開工預告公文及宣導



### ●監造及工務會議



例行性工務會議



例行性工務會議



例行性工務會議



例行性工務會議

### ●工程告示牌





## 附件2

### ●工地督導訪查



工區之會勘研討



機關走動管理偕同



機關督導之會同



機關走動管理偕同



工地視察



工地視察



工地視察








工地視察



## 附件2

### ●北勢國小期刊(向親師生及社區宣導工程進度及履約情形)
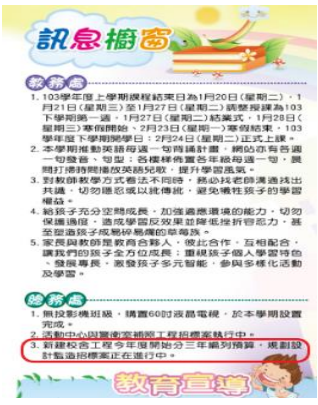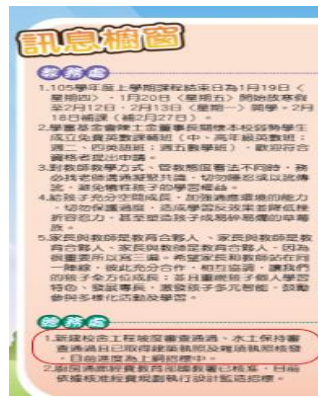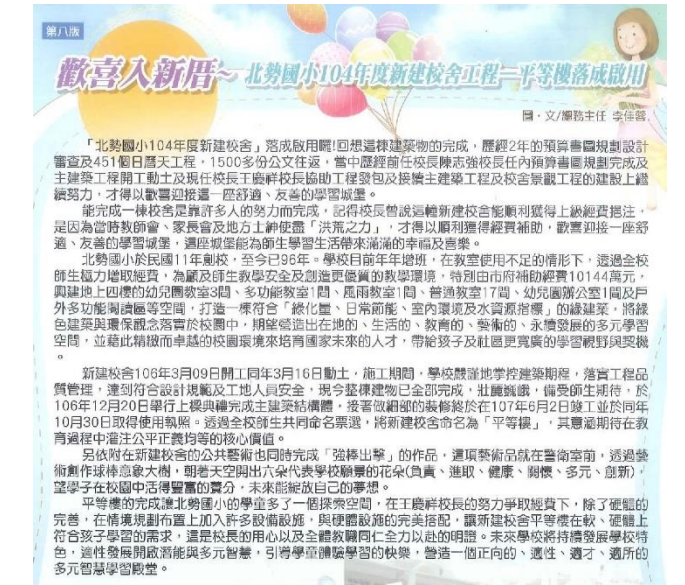
| 104年01月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104年06月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105年01月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105年06月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>訊息櫥窗</b></p> <p><b>教務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>103學年度上學期課程結束日為1月20日(星期二)，1月21日(星期三)至1月27日(星期二)假期為103學年度下學期開學日。1月27日(星期二)正式上課。</li> <li>本學期推動英語每週一節英語課，請於每週一節英語課，每位同學準備一首英語詩，並於每週一節英語課時，將英語詩朗誦給老師聽。</li> <li>對教師教學方式看法不同時，務必找老師溝通找出其適。切勿惡意以此傳佈，避免犧牲孩子的學習權益。</li> <li>給孩子充分空間成長，加強適應環境的能力，切勿保護過度，造成學習效果並降低挫折耐受力，甚至造成孩子心理障礙。</li> <li>家長與教師是教育合夥人，彼此合作、互相配合，讓我們的孩子全方位成長。重視孩子個人學習特色、發展專長、激發孩子多元智能，參與多種化活動及學習。</li> </ol> <p><b>總務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>無校務班級，購買60吋液晶電視，於本學期設置完成。</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>新校舍工程進度表如下：</li> </ol> <p><b>教育宣導</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  <p><b>訊息櫥窗</b></p> <p><b>教務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>104學年度上學期課程結束日為6月20日(星期二)，6月21日(星期三)至6月27日(星期二)假期為104學年度下學期開學日。6月27日(星期二)正式上課。</li> <li>本學期推動英語每週一節英語課，請於每週一節英語課，每位同學準備一首英語詩，並於每週一節英語課時，將英語詩朗誦給老師聽。</li> <li>對教師教學方式看法不同時，務必找老師溝通找出其適。切勿惡意以此傳佈，避免犧牲孩子的學習權益。</li> <li>給孩子充分空間成長，加強適應環境的能力，切勿保護過度，造成學習效果並降低挫折耐受力，甚至造成孩子心理障礙。</li> <li>家長與教師是教育合夥人，彼此合作、互相配合，讓我們的孩子全方位成長。重視孩子個人學習特色、發展專長、激發孩子多元智能，參與多種化活動及學習。</li> </ol> <p><b>總務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>無校務班級，購買60吋液晶電視，於本學期設置完成。</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>新校舍工程進度表如下：</li> </ol> <p><b>教育宣導</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> </ol>  |  <p><b>訊息櫥窗</b></p> <p><b>教務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>105學年度上學期課程結束日為1月20日(星期二)，1月21日(星期三)至1月27日(星期二)假期為105學年度下學期開學日。1月27日(星期二)正式上課。</li> <li>本學期推動英語每週一節英語課，請於每週一節英語課，每位同學準備一首英語詩，並於每週一節英語課時，將英語詩朗誦給老師聽。</li> <li>對教師教學方式看法不同時，務必找老師溝通找出其適。切勿惡意以此傳佈，避免犧牲孩子的學習權益。</li> <li>給孩子充分空間成長，加強適應環境的能力，切勿保護過度，造成學習效果並降低挫折耐受力，甚至造成孩子心理障礙。</li> <li>家長與教師是教育合夥人，彼此合作、互相配合，讓我們的孩子全方位成長。重視孩子個人學習特色、發展專長、激發孩子多元智能，參與多種化活動及學習。</li> </ol> <p><b>總務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>無校務班級，購買60吋液晶電視，於本學期設置完成。</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>新校舍工程進度表如下：</li> </ol> <p><b>教育宣導</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> </ol>  |  <p><b>訊息櫥窗</b></p> <p><b>教務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>105學年度上學期課程結束日為6月20日(星期二)，6月21日(星期三)至6月27日(星期二)假期為105學年度下學期開學日。6月27日(星期二)正式上課。</li> <li>本學期推動英語每週一節英語課，請於每週一節英語課，每位同學準備一首英語詩，並於每週一節英語課時，將英語詩朗誦給老師聽。</li> <li>對教師教學方式看法不同時，務必找老師溝通找出其適。切勿惡意以此傳佈，避免犧牲孩子的學習權益。</li> <li>給孩子充分空間成長，加強適應環境的能力，切勿保護過度，造成學習效果並降低挫折耐受力，甚至造成孩子心理障礙。</li> <li>家長與教師是教育合夥人，彼此合作、互相配合，讓我們的孩子全方位成長。重視孩子個人學習特色、發展專長、激發孩子多元智能，參與多種化活動及學習。</li> </ol> <p><b>總務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>無校務班級，購買60吋液晶電視，於本學期設置完成。</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>新校舍工程進度表如下：</li> </ol> <p><b>教育宣導</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> </ol>  |
| 106年01月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106年06月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107年01月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107年06月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <p><b>訊息櫥窗</b></p> <p><b>教務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>106學年度上學期課程結束日為1月20日(星期二)，1月21日(星期三)至1月27日(星期二)假期為106學年度下學期開學日。1月27日(星期二)正式上課。</li> <li>本學期推動英語每週一節英語課，請於每週一節英語課，每位同學準備一首英語詩，並於每週一節英語課時，將英語詩朗誦給老師聽。</li> <li>對教師教學方式看法不同時，務必找老師溝通找出其適。切勿惡意以此傳佈，避免犧牲孩子的學習權益。</li> <li>給孩子充分空間成長，加強適應環境的能力，切勿保護過度，造成學習效果並降低挫折耐受力，甚至造成孩子心理障礙。</li> <li>家長與教師是教育合夥人，彼此合作、互相配合，讓我們的孩子全方位成長。重視孩子個人學習特色、發展專長、激發孩子多元智能，參與多種化活動及學習。</li> </ol> <p><b>總務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>無校務班級，購買60吋液晶電視，於本學期設置完成。</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>新校舍工程進度表如下：</li> </ol> <p><b>教育宣導</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <p><b>訊息櫥窗</b></p> <p><b>教務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>106學年度上學期課程結束日為6月20日(星期二)，6月21日(星期三)至6月27日(星期二)假期為106學年度下學期開學日。6月27日(星期二)正式上課。</li> <li>本學期推動英語每週一節英語課，請於每週一節英語課，每位同學準備一首英語詩，並於每週一節英語課時，將英語詩朗誦給老師聽。</li> <li>對教師教學方式看法不同時，務必找老師溝通找出其適。切勿惡意以此傳佈，避免犧牲孩子的學習權益。</li> <li>給孩子充分空間成長，加強適應環境的能力，切勿保護過度，造成學習效果並降低挫折耐受力，甚至造成孩子心理障礙。</li> <li>家長與教師是教育合夥人，彼此合作、互相配合，讓我們的孩子全方位成長。重視孩子個人學習特色、發展專長、激發孩子多元智能，參與多種化活動及學習。</li> </ol> <p><b>總務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>無校務班級，購買60吋液晶電視，於本學期設置完成。</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>新校舍工程進度表如下：</li> </ol> <p><b>教育宣導</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> </ol> |  <p><b>訊息櫥窗</b></p> <p><b>教務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>107學年度上學期課程結束日為1月20日(星期二)，1月21日(星期三)至1月27日(星期二)假期為107學年度下學期開學日。1月27日(星期二)正式上課。</li> <li>本學期推動英語每週一節英語課，請於每週一節英語課，每位同學準備一首英語詩，並於每週一節英語課時，將英語詩朗誦給老師聽。</li> <li>對教師教學方式看法不同時，務必找老師溝通找出其適。切勿惡意以此傳佈，避免犧牲孩子的學習權益。</li> <li>給孩子充分空間成長，加強適應環境的能力，切勿保護過度，造成學習效果並降低挫折耐受力，甚至造成孩子心理障礙。</li> <li>家長與教師是教育合夥人，彼此合作、互相配合，讓我們的孩子全方位成長。重視孩子個人學習特色、發展專長、激發孩子多元智能，參與多種化活動及學習。</li> </ol> <p><b>總務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>無校務班級，購買60吋液晶電視，於本學期設置完成。</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>新校舍工程進度表如下：</li> </ol> <p><b>教育宣導</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> </ol> |  <p><b>訊息櫥窗</b></p> <p><b>教務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>107學年度上學期課程結束日為6月20日(星期二)，6月21日(星期三)至6月27日(星期二)假期為107學年度下學期開學日。6月27日(星期二)正式上課。</li> <li>本學期推動英語每週一節英語課，請於每週一節英語課，每位同學準備一首英語詩，並於每週一節英語課時，將英語詩朗誦給老師聽。</li> <li>對教師教學方式看法不同時，務必找老師溝通找出其適。切勿惡意以此傳佈，避免犧牲孩子的學習權益。</li> <li>給孩子充分空間成長，加強適應環境的能力，切勿保護過度，造成學習效果並降低挫折耐受力，甚至造成孩子心理障礙。</li> <li>家長與教師是教育合夥人，彼此合作、互相配合，讓我們的孩子全方位成長。重視孩子個人學習特色、發展專長、激發孩子多元智能，參與多種化活動及學習。</li> </ol> <p><b>總務處</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>無校務班級，購買60吋液晶電視，於本學期設置完成。</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>新校舍工程進度表如下：</li> </ol> <p><b>教育宣導</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> <li>本校校舍工程進度表如下：</li> </ol> |
| 108年01月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  <p><b>歡喜入新居-北勢國小104年度新建校舍工程一等優等落成啟用</b></p> <p>圖、文/編輯主任 李俊傑</p> <p>「北勢國小104年度新建校舍」落成啟用!回想這棟建築物的完成，歷經2年的預備書圖規劃設計、451個日晝天工程、1500多份公文往返，當中歷經校長張志強校長任內預辦書圖規劃完成及主建築工程開工動土及現任校長陳祥林校長協助工程發包及接辦主建築工程及校舍景觀工程的建設上繼續努力，才得以歡喜迎接這一座舒適、友善的學習環境。</p> <p>能完成一棟校舍是許多人的努力而完成，記得校長曾說過這棟新校舍能順利獲得上級經費支持，是因為當時教師、家長及地方人士使盡「洪荒之力」，才得以順利獲得經費補助，歡喜迎接一座舒適、友善的學習環境。適逢這座校舍為師生學習生活帶來滿溢的幸福及喜樂。</p> <p>北勢國小於民國111年創校，至今已96年。學校自前年開始，在教室使用不足的情形下，透過全校師生協力增建教室，為及師生教學安全及創造更優質的教學環境。特別由市府補助經費1014.4萬元，購建地上四樓的幼兒園教室3間、多功能教室1間、風雨教室1間、普通教室17間、幼兒園辦公室1間及戶外多功能活動場等空間。打造一座符合「綠化、節能、安全、室內環境及水資源循環」的綠建築，將綠色建築與環境觀念落實於校園中，期望能創造出在地、生活的、教育的、藝術的、永續發展的多元學習空間，並藉此精緻而卓越的校園環境來培育國家未來的人才，帶給孩子及社區更寬廣的學習視野與突破。</p> <p>新建築舍106年3月09日開工同年3月16日動土，施工期間，學校嚴謹地掌控建築期程，落實工程品質管理，達到符合設計規範及工地人員安全。現今該棟建築物已全部完成，壯麗雄偉，儼然師生期待，於106年12月20日舉行上樑典禮完成主建築結構。接著該組的裝修將於107年6月2日竣工並於同年10月30日取得使用執照。透過全校師生共同努力，將新建築舍命名為「平等樓」，其意蘊期許在教育過程中關注公平正義等的核心價值。</p> <p>另依附在新建築舍的公共藝術也同時完成，「強棒出擊」的作品，這項藝術品就在藝術室前，透過藝術家球棒意象大樹，朝著天空開出八家代表學科精華的花朵(負責、進取、健康、關懷、多元、創新)，望學子在校園中活潑豐富的精神，未來能綻放自己的夢想。</p> <p>平等樓的完成讓北勢國小學童多了一個探索空間，在工農科校長的努力爭取經費下，除了硬體的完善，在環境規劃上加入許多設備設施，與硬體的完美搭配，讓新建築舍平等樓在軟、硬體上符合孩子學習的需求，這是校長及全體教職同仁全力以赴的期許。未來學校將持續發展學校特色，適性發展開成能與多元智慧，引導學子體驗學習的快樂，營造一個正向的、適性、適才、適所的多元智慧學習環境。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## 附件2

### ●動土典禮



機關及地方參與及訪視



機關及地方參與及訪視



### ●落成典禮



網站導覽 En

熱門公告 關於市府 市政資訊 認識臺中 市民服務 生活及防災 網站連結 市府各機關

現在位置 > 首頁 > 熱門公告 > 市政新聞

#### 沙鹿北勢國小新建校舍落成 提供學子舒適學習空間



1071020-北勢國小校舍落成典禮\_181020\_0024

臺中市沙鹿區北勢國小的就學人數近年來持續增加，有教室空間不足的情形，因此市府補助經費1億144萬元，在學校新建一座綠建築校舍，可作為幼兒園的活動空間及普通教室使用，提供學生更好的教育環境。

教育局今(20)日舉辦北勢國小新建校舍落成啟用典禮，市長林佳龍、副市长張光瑤也出席共襄盛舉，盼學生能在優良的教學環境下學習成長。

林市長表示，北勢國小近幾年來在棒球、偶戲、國語文競賽等都有不錯的成績，市府同時也提供學校許多教育資源，例如協助北勢國小完成21間頂樓教室裝設冷氣、汰換400多套老式課桌椅、學校四周圍設置人本通行步道等，現在新建校舍落成，希望提供學校更優質的教育環境。

教育局表示，北勢國小緊鄰大肚山麓，於民國11年創校，至今已96年，近年來由於交通及地方建設規劃完善，生活機能便利，加上托育一條龍福利政策，吸引許多外地人口遷入，使學齡兒童人數持續增加，學校年年增班，導致有教室空間不足的情形。

為協助學校解決問題，市府補助經費1億144萬元，打造一棟符合「綠化量、日常節能及水資源指標」的綠建築校舍，並命名為「平等樓」，「平等樓」有4層樓，1樓是幼兒園的活動空間，2樓以上則有17間教室作為普通教室使用。

此外，教育局今天也在台中教育大學舉辦「107學年度台中市實驗教育高中階段學生升學進路說明會」，說明大學多元入學管道及特殊選才招生資訊，並邀請2名經由特殊選才進入大學的學生分享升學經驗，吸引許多參與實驗教育的教師、家長及學生參加。

另外，教育局今日並在大里高中舉辦「i影想」教師工作坊，吸引約60名教師參與，選定主題影片《與信仰對話》，並由拍攝影片的導演王盈瑩擔任主講人，透過電影賞析的方式進行議題思辨，讓每位參與者增進相關知識與學養，希望透過討論，讓教師的教學內容更加多元。(10/20\*13)\*教育局

聯絡人:台中市政府教育局 黃小姐

聯絡電話:04-22289111分機54323

市府分類: 教育文化 發布日期: 2018-10-20 點閱次數: 2711





#### 4. 都市審議簽到

臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程  
校園規劃設計審議委員會三人小組 簽到表  
104年10月29日

| 編號 | 姓名  | 簽到時間       | 簽到地點         | 簽到方式 |
|----|-----|------------|--------------|------|
| 1  | 陳品  | 104年10月29日 | 臺中市沙鹿區北勢國民小學 | 簽到   |
| 2  | 李新昌 | 104年10月29日 | 臺中市沙鹿區北勢國民小學 | 簽到   |
| 3  | 葉忠  | 104年10月29日 | 臺中市沙鹿區北勢國民小學 | 簽到   |
| 4  | 陳志強 | 104年10月29日 | 臺中市沙鹿區北勢國民小學 | 簽到   |
| 5  | 謝文  | 104年10月29日 | 臺中市沙鹿區北勢國民小學 | 簽到   |
| 6  | 林文  | 104年10月29日 | 臺中市沙鹿區北勢國民小學 | 簽到   |
| 7  | 張   | 104年10月29日 | 臺中市沙鹿區北勢國民小學 | 簽到   |

第1頁，共1頁

#### 5. 都市審議意見

臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程  
校園規劃設計審議委員會三人小組會議  
審議委員意見表

日期：104年10月29日  
時間：下午12時30分

委員意見：

1. 外牆牆面應注意垂直度，並注意垂直度，並注意垂直度。
2. 外牆牆面應注意垂直度，並注意垂直度，並注意垂直度。
3. 外牆牆面應注意垂直度，並注意垂直度，並注意垂直度。
4. 外牆牆面應注意垂直度，並注意垂直度，並注意垂直度。
5. 外牆牆面應注意垂直度，並注意垂直度，並注意垂直度。
6. 外牆牆面應注意垂直度，並注意垂直度，並注意垂直度。
7. 外牆牆面應注意垂直度，並注意垂直度，並注意垂直度。
8. 外牆牆面應注意垂直度，並注意垂直度，並注意垂直度。
9. 外牆牆面應注意垂直度，並注意垂直度，並注意垂直度。
10. 外牆牆面應注意垂直度，並注意垂直度，並注意垂直度。

審議委員：陳品、李新昌、葉忠、陳志強、謝文、林文、張

#### 6. 預算書圖審核意見表

「臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程」  
預算書圖審核意見表(第1次)

時間：105年12月5日  
審核委員：李新昌

審核意見：

有關設計部分與其他意見，惟建議審議單位於施工階段應加強執行監工、監工系統及品質控制之施工品質，俾使本樣校區能如期開學並發揮教育功能。

審核委員：李新昌

審核日期：105年12月5日

#### 7. 預算書圖同意備查

臺中市政府教育局 函

受文者：臺中市沙鹿區北勢國民小學

主旨：有關貴校提送「臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程」預算書圖，業經本局核議完竣，除分函各相關單位外，合行函請貴校備查。

說明：查貴校105年12月5日提送本局105000384號函，業經本局核議完竣，除分函各相關單位外，合行函請貴校備查。

局長：張文

#### 8. 水利局水土保持許可證

臺中市政府水利局 函

受文者：永成建築師事務所

主旨：有關貴事務所提送「臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程」水土保持計畫，業經本局核議完竣，除分函各相關單位外，合行函請貴事務所備查。

說明：查貴事務所105年12月5日提送本局105000384號函，業經本局核議完竣，除分函各相關單位外，合行函請貴事務所備查。

局長：張文

#### 9. 變更設計開會公文(1)

臺中市政府教育局 函

受文者：臺中市沙鹿區北勢國民小學

主旨：有關貴校提送「臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程」第一次變更設計會議紀錄，業經本局核議完竣，除分函各相關單位外，合行函請貴校備查。

說明：查貴校105年12月5日提送本局105000384號函，業經本局核議完竣，除分函各相關單位外，合行函請貴校備查。

局長：張文

#### 10. 變更設計開會公文(2)

臺中市政府教育局 函

受文者：臺中市沙鹿區北勢國民小學

主旨：有關貴校提送「臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程」第二次變更設計會議紀錄，業經本局核議完竣，除分函各相關單位外，合行函請貴校備查。

說明：查貴校105年12月5日提送本局105000384號函，業經本局核議完竣，除分函各相關單位外，合行函請貴校備查。

局長：張文

#### 11. 建築師變更設計公文

張新成建築師事務所 函

受文者：臺中市政府教育局(工務處)

主旨：有關貴處提送「臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程」第一次變更設計會議紀錄，業經本所核議完竣，除分函各相關單位外，合行函請貴處備查。

說明：查貴處105年12月5日提送本所105000384號函，業經本所核議完竣，除分函各相關單位外，合行函請貴處備查。

事務所：張新成

#### 12. 第一次變更設計議定書

「臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程」  
第一次變更設計會議紀錄

會議時間：105年12月5日

會議地點：臺中市沙鹿區北勢國民小學

出席人員：張新成、李新昌、葉忠、陳志強、謝文、林文、張

會議內容：

- 一、有關變更設計會議紀錄，業經本所核議完竣，除分函各相關單位外，合行函請貴處備查。
- 二、有關變更設計會議紀錄，業經本所核議完竣，除分函各相關單位外，合行函請貴處備查。
- 三、有關變更設計會議紀錄，業經本所核議完竣，除分函各相關單位外，合行函請貴處備查。


事務所：張新成

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| <h3>1. 查核改善聯繫</h3> | <h3>2. 材料查驗聯繫</h3> | <h3>3. 公文即時聯繫</h3>   |
| <h3>4. 施工作業聯繫</h3> | <h3>5. 查核即時紀錄</h3> | <h3>6. 工地狀況即時聯繫</h3> |
| <h3>7. 進度掌握聯繫</h3> | <h3>8. 工程訪視紀錄</h3> | <h3>9. 突發性地震後聯繫</h3> |


## 10. 防汛減災檢查紀錄




## 11. 颱風來襲加強工地防護

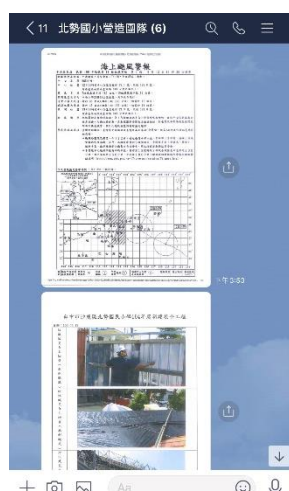

## 12. 聯繫上級單位查核配合

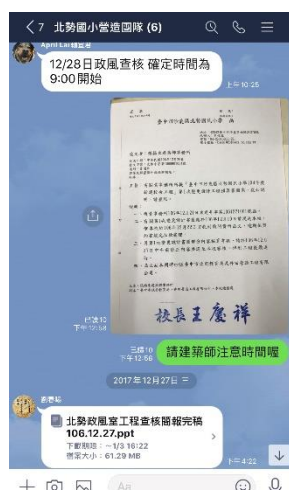

## 13. 防汛檢查結果表即時

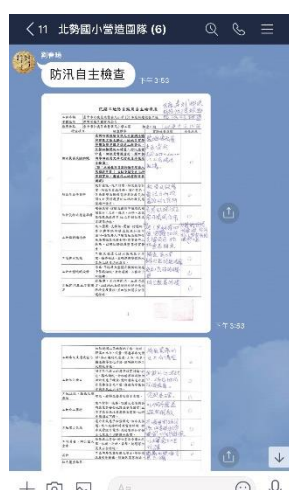



## 附件5

### ●公共工程監造報表

**公共工程監造報表**

表報編號： 填報日期： 民國106年3月24日 星期五

本日天氣： 上午：晴 下午：晴

|         |                         |         |          |        |              |
|---------|-------------------------|---------|----------|--------|--------------|
| 工程名稱    | 臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程 |         |          |        |              |
| 契約工期    | 400天                    | 開工日期    | 2017/3/9 | 預定完工日期 | 2018/4/12    |
| 契約變更次數  | 次                       | 工期展延天數  | 天        | 實際完工日期 |              |
| 預定進度(%) | 0.39%                   | 實際進度(%) | 0.54%    | 契約金額   | 原契約：86920000 |
| 變更後契約：  |                         |         |          |        |              |

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)：

詳地工日誌

基地內既有喬木移植

工程告示牌施作

臨時工務所撤除

臨時廁所施作

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

四、其他的定監造事項(含督導工地勞工安全衛生事項、重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

建管科至工地放樣動線

至臺中市政府陽明大樓參加106年度臺中市職場安全衛生促進暨減災計畫講習

計畫書審查

監造單位簽章： 簽章

註：1.監造報表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容詳載於廠商填報之施工日誌，則得省略該欄位。  
 2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬零散監造之工程，則一律按日填寫。本表查核金額或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽察程序及監造報表之填報方式與頻率。  
 3.本監造報表係供參考，各機關得依契約約定事項，自行增訂之。  
 4.契約工期如展延，應填報展延之日期，含展延工期及不計工期天數；如有契約變更設計，預定進度及實際進度應填報變更設計後計算之進度。  
 5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理，惟該工程之監造人(建築師)，應另依內政部九十六年六月六日台內營字第○九九六○二九五○號令頒之「建築物(監督、查核)報告表」填報(頻率按該表註2辦理)。

### ●建築物施工日誌

**建築物施工日誌**

工程名稱： 臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程

填報日期： 民國106年3月24日 星期五

本日天氣： 上午：晴 下午：晴

|         |       |         |          |        |              |
|---------|-------|---------|----------|--------|--------------|
| 契約工期    | 400天  | 開工日期    | 2017/3/9 | 預定完工日期 | 2018/4/12    |
| 契約變更次數  | 次     | 工期展延天數  | 天        | 實際完工日期 |              |
| 預定進度(%) | 0.39% | 實際進度(%) | 0.54%    | 契約金額   | 原契約：86920000 |
| 變更後契約：  |       |         |          |        |              |

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及完成數量)：

詳地工日誌

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

四、其他的定監造事項(含督導工地勞工安全衛生事項、重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

建管科至工地放樣動線

至臺中市政府陽明大樓參加106年度臺中市職場安全衛生促進暨減災計畫講習

計畫書審查

監造單位簽章： 簽章

註：1.監造報表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容詳載於廠商填報之施工日誌，則得省略該欄位。  
 2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬零散監造之工程，則一律按日填寫。本表查核金額或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽察程序及監造報表之填報方式與頻率。  
 3.本監造報表係供參考，各機關得依契約約定事項，自行增訂之。  
 4.契約工期如展延，應填報展延之日期，含展延工期及不計工期天數；如有契約變更設計，預定進度及實際進度應填報變更設計後計算之進度。  
 5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理，惟該工程之監造人(建築師)，應另依內政部九十六年六月六日台內營字第○九九六○二九五○號令頒之「建築物(監督、查核)報告表」填報(頻率按該表註2辦理)。

# ◎本工程材料進場抽查紀錄

表5-2 材料試驗申請登記表

|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
| 工程名稱：臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程                                                                                                                                                                                               |  |                                                                |  |
| 中區：106年9月30日                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                |  |
| 編號：                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                |  |
| 施工廠商：奇豐營造工程股份有限公司                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                |  |
| 材料名稱：三種級/規格鋼筋                                                                                                                                                                                                              |  | 規格/單位                                                          |  |
| 送場日期：106年9月27-28日                                                                                                                                                                                                          |  | 送場數量：預計 S200 7.72T<br>S200V 25.13T<br>S200 64 98<br>S11 311 3A |  |
| 材料廠商提供證明文件：由廠商提供<br>檢驗證明：由廠商提供                                                                                                                                                                                             |  |                                                                |  |
| 材料檢驗地點：工地                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                |  |
| 材料規格/編號：S200<br>S11-110 S200V                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |
| 檢驗方式：<br><input type="checkbox"/> 取樣檢驗 <input type="checkbox"/> 留樣品留樣 <input checked="" type="checkbox"/> 工地現場檢驗<br><input checked="" type="checkbox"/> 材料試驗室檢驗 <input type="checkbox"/> 書面審核 <input type="checkbox"/> 其他： |  |                                                                |  |
| 取樣：取樣數量：S200、S11、S200V 各一支隨現場留樣                                                                                                                                                                                            |  |                                                                |  |
| 留樣品存放地點：實驗室測試                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |
| 取樣日期：10/15 送樣日期：10/15 試驗日期：10/15                                                                                                                                                                                           |  |                                                                |  |
| 檢驗人員：廖清輝 試驗室人員：廖清輝                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                |  |
| 試驗檢核名稱：實驗室應符合 CNS 17025 (ISO 15189) 之規定                                                                                                                                                                                    |  |                                                                |  |
| 試驗報告編號：17-0527                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 如試驗報告                                                                                                                                                                                  |  |                                                                |  |
| 試驗項目：合格值：試驗值：                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |
| 試驗項目：合格值：試驗值：                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |
| 試驗項目：合格值：試驗值：                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |  |
| 檢驗結果：<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格同意使用<br><input type="checkbox"/> 不合格應離場<br><input type="checkbox"/> 數量不足<br><input type="checkbox"/> 材料檢驗場所不良<br><input type="checkbox"/> 其他：                               |  |                                                                |  |
| 施工廠商 (簽名)：廖清輝                                                                                                                                                                                                              |  | 施工人員 (簽名)：廖清輝                                                  |  |

判定是否合格進場使用

抽測值紀錄詳細

台中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程



材料試驗申請登記表

|                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工程名稱：臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程                                                                                                                                                                                               |  |
| 中區：106年9月30日                                                                                                                                                                                                               |  |
| 編號：                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 施工廠商：奇豐營造工程股份有限公司                                                                                                                                                                                                          |  |
| 材料名稱：三種級/規格鋼筋                                                                                                                                                                                                              |  |
| 送場日期：106年9月27-28日                                                                                                                                                                                                          |  |
| 送場數量：預計 S200 7.72T<br>S200V 25.13T<br>S200 64 98<br>S11 311 3A                                                                                                                                                             |  |
| 材料廠商提供證明文件：由廠商提供<br>檢驗證明：由廠商提供                                                                                                                                                                                             |  |
| 材料檢驗地點：工地                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 材料規格/編號：S200<br>S11-110 S200V                                                                                                                                                                                              |  |
| 檢驗方式：<br><input type="checkbox"/> 取樣檢驗 <input type="checkbox"/> 留樣品留樣 <input checked="" type="checkbox"/> 工地現場檢驗<br><input checked="" type="checkbox"/> 材料試驗室檢驗 <input type="checkbox"/> 書面審核 <input type="checkbox"/> 其他： |  |
| 取樣：取樣數量：S200、S11、S200V 各一支隨現場留樣                                                                                                                                                                                            |  |
| 留樣品存放地點：實驗室測試                                                                                                                                                                                                              |  |
| 取樣日期：10/15 送樣日期：10/15 試驗日期：10/15                                                                                                                                                                                           |  |
| 檢驗人員：廖清輝 試驗室人員：廖清輝                                                                                                                                                                                                         |  |
| 試驗檢核名稱：實驗室應符合 CNS 17025 (ISO 15189) 之規定                                                                                                                                                                                    |  |
| 試驗報告編號：17-0527                                                                                                                                                                                                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 如試驗報告                                                                                                                                                                                  |  |
| 試驗項目：合格值：試驗值：                                                                                                                                                                                                              |  |
| 試驗項目：合格值：試驗值：                                                                                                                                                                                                              |  |
| 試驗項目：合格值：試驗值：                                                                                                                                                                                                              |  |
| 檢驗結果：<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格同意使用<br><input type="checkbox"/> 不合格應離場<br><input type="checkbox"/> 數量不足<br><input type="checkbox"/> 材料檢驗場所不良<br><input type="checkbox"/> 其他：                               |  |
| 施工廠商 (簽名)：廖清輝                                                                                                                                                                                                              |  |
| 施工人員 (簽名)：廖清輝                                                                                                                                                                                                              |  |

材料試驗申請登記表

|                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工程名稱：臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程                                                                                                                                                                                               |  |
| 中區：106年9月30日                                                                                                                                                                                                               |  |
| 編號：                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 施工廠商：奇豐營造工程股份有限公司                                                                                                                                                                                                          |  |
| 材料名稱：三種級/規格鋼筋                                                                                                                                                                                                              |  |
| 送場日期：106年9月27-28日                                                                                                                                                                                                          |  |
| 送場數量：預計 S200 7.72T<br>S200V 25.13T<br>S200 64 98<br>S11 311 3A                                                                                                                                                             |  |
| 材料廠商提供證明文件：由廠商提供<br>檢驗證明：由廠商提供                                                                                                                                                                                             |  |
| 材料檢驗地點：工地                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 材料規格/編號：S200<br>S11-110 S200V                                                                                                                                                                                              |  |
| 檢驗方式：<br><input type="checkbox"/> 取樣檢驗 <input type="checkbox"/> 留樣品留樣 <input checked="" type="checkbox"/> 工地現場檢驗<br><input checked="" type="checkbox"/> 材料試驗室檢驗 <input type="checkbox"/> 書面審核 <input type="checkbox"/> 其他： |  |
| 取樣：取樣數量：S200、S11、S200V 各一支隨現場留樣                                                                                                                                                                                            |  |
| 留樣品存放地點：實驗室測試                                                                                                                                                                                                              |  |
| 取樣日期：10/15 送樣日期：10/15 試驗日期：10/15                                                                                                                                                                                           |  |
| 檢驗人員：廖清輝 試驗室人員：廖清輝                                                                                                                                                                                                         |  |
| 試驗檢核名稱：實驗室應符合 CNS 17025 (ISO 15189) 之規定                                                                                                                                                                                    |  |
| 試驗報告編號：17-0527                                                                                                                                                                                                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 如試驗報告                                                                                                                                                                                  |  |
| 試驗項目：合格值：試驗值：                                                                                                                                                                                                              |  |
| 試驗項目：合格值：試驗值：                                                                                                                                                                                                              |  |
| 試驗項目：合格值：試驗值：                                                                                                                                                                                                              |  |
| 檢驗結果：<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格同意使用<br><input type="checkbox"/> 不合格應離場<br><input type="checkbox"/> 數量不足<br><input type="checkbox"/> 材料檢驗場所不良<br><input type="checkbox"/> 其他：                               |  |
| 施工廠商 (簽名)：廖清輝                                                                                                                                                                                                              |  |
| 施工人員 (簽名)：廖清輝                                                                                                                                                                                                              |  |



## ●材料設備送審管制總表

| 序次 | 契約關係及序次<br>材料設備名稱          | 契約數量       | 是否市<br>場採購 | 決定品質日期<br>實際品質日期       | 是否檢驗<br>檢驗日期 | 決定訂<br>驗單位 | 送審資料 (")<br>原標<br>經銷商送審資料 | 標品 | 其他 | 應收日期<br>實際收單                | 備註                                  |
|----|----------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------------------|----|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 第一 3.7<br>鋼筋φ2080          | 103T       | 是          | 106/03/22              | 是            |            |                           |    |    | 45同業<br>414業主直              | 於106/4/13開標                         |
|    | 第二 3.8<br>鋼筋φ2420W         | 498T       | 是          | 106/03/20<br>106/04/20 | 106/3/31     |            |                           |    |    |                             |                                     |
|    | 標品送                        |            |            | 106/3/24<br>106/4/20   | 106/4/8      |            |                           |    |    | 47同業<br>414業主直              | 於106/4/26開標                         |
|    | 第三 3.10<br>鋼筋直徑φ140kg/m2   | 68M3       | 是          | 106/3/22               |              |            |                           |    |    |                             |                                     |
| 2  | 第四 3.11<br>鋼筋直徑φ1425kg/m2  | 1003M3     | 是          |                        | 106/3/14     | 106/3/20   |                           |    |    | 32/1同業<br>414業主直            | 於106/4/5開標                          |
|    | 第五 3.12<br>鋼筋直徑φ1425kg/m2  | 1818M3     | 是          |                        |              |            |                           |    |    |                             |                                     |
|    | 第六 3.13<br>鋼筋直徑φ1425kg/m2  |            |            | 106/3/20               | 是            |            |                           |    |    | 32/1同業                      | 於106/3/23開標                         |
|    | 第七 3.14<br>鋼筋直徑φ1425kg/m2  | 13T        | 是          | 106/11/20              |              |            |                           |    |    | 112同業<br>32/1同業<br>32/1同業   |                                     |
| 3  | 第八 3.15<br>鋼筋直徑φ1425kg/m2  | 2559M3     | 是          | 106/12/10              |              |            |                           |    |    |                             |                                     |
|    | 第九 3.16<br>鋼筋直徑φ1425kg/m2  | 222M3      | 是          | 106/12/10              |              |            |                           |    |    | 12/15同業                     | 於106/12/18開標                        |
|    | 第十 3.17<br>鋼筋直徑φ1425kg/m2  | 2457M3     | 是          | 106/11/01              |              |            |                           |    |    | 11/13同業                     | 於106/11/17開標                        |
|    | 第十一 3.18<br>鋼筋直徑φ1425kg/m2 | 1548M3     | 是          | 106/11/01              |              |            |                           |    |    |                             |                                     |
| 4  | 第十二 3.19<br>鋼筋直徑φ1425kg/m2 | 1368M3     | 是          | 106/10/31              |              |            |                           |    |    | 11/14同業<br>32/1同業<br>32/1同業 | 於107/1/14開標<br>第二次12/29<br>第三次12/29 |
|    | 第十三 3.20<br>鋼筋直徑φ1425kg/m2 | 192M3      | 是          | 106/12/01              |              |            |                           |    |    |                             |                                     |
|    | 第十四 3.21<br>鋼筋直徑φ1425kg/m2 | 43M3       | 是          | 106/12/01              |              |            |                           |    |    | 12/15同業<br>32/1同業<br>32/1同業 | 於107/1/14開標<br>第二次12/29<br>第三次12/29 |
|    | 第十五 3.22<br>鋼筋直徑φ1425kg/m2 | 2330M3+208 | 是          | 106/10/01              |              |            |                           |    |    | 10/14同業<br>32/1同業<br>32/1同業 | 於107/1/14開標<br>第二次12/29<br>第三次12/29 |

臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程

| 檢(試)項目：土壤工地密度試驗(一樓版下) |                       |          |          |          |                  |                  |                  |                  |                  |                                             |                                             |
|-----------------------|-----------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 項目                    | 試驗機號                  | 預定施工日期   | 取樣日期     | 試驗日期     | 取樣人員             | 送驗人員             | 會驗人員             | 試驗標準             | 試驗結果             | 備註                                          |                                             |
| 1                     | 1(砂樣<br>D-4<br>1line) | 106/6/12 | 106/6/12 | 106/6/12 | 106/6/12         | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 容重度90%           | 容重度試驗, 85%                                  | 07/3831/423<br>試驗結果:<br>33011771-0<br>試驗結果: |
|                       |                       |          |          |          |                  |                  |                  |                  | 3%(最小含水量(8.7%)<) | 8.80%                                       |                                             |
|                       |                       |          |          |          |                  |                  |                  |                  | 容重度90%           | 容重度91.25%                                   |                                             |
| 2                     | 2(砂樣<br>C-3<br>1line) | 106/6/12 | 106/6/12 | 106/6/12 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 3%(最小含水量(8.7%)<) | 8.80%            | 07/3831/423<br>試驗結果:<br>33011771-0<br>試驗結果: |                                             |
|                       |                       |          |          |          |                  |                  |                  | 容重度90%           | 容重度91.25%        |                                             |                                             |
|                       |                       |          |          |          |                  |                  |                  | 容重度90%           | 容重度91.45%        |                                             |                                             |
| 3                     | 3(砂樣<br>D-5<br>1line) | 106/6/12 | 106/6/12 | 106/6/12 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 3%(最小含水量(8.7%)<) | 9.30%            | 07/3831/423<br>試驗結果:<br>33011771-0<br>試驗結果: |                                             |
|                       |                       |          |          |          |                  |                  |                  | 容重度90%           | 容重度90.5%         |                                             |                                             |
|                       |                       |          |          |          |                  |                  |                  | 容重度90%           | 容重度90.5%         |                                             |                                             |
| 4                     | 4(砂樣<br>C-2<br>1line) | 106/6/12 | 106/6/12 | 106/6/12 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 3%(最小含水量(8.7%)<) | 10.60%           | 07/3831/423<br>試驗結果:<br>33011771-0<br>試驗結果: |                                             |
|                       |                       |          |          |          |                  |                  |                  | 容重度90%           | 容重度90.5%         |                                             |                                             |
|                       |                       |          |          |          |                  |                  |                  | 容重度90%           | 容重度91.45%        |                                             |                                             |
| 5                     | 5(砂樣<br>C-5<br>1line) | 106/6/12 | 106/6/12 | 106/6/12 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 3%(最小含水量(8.7%)<) | 11.80%           | 07/3831/423<br>試驗結果:<br>33011771-0<br>試驗結果: |                                             |
|                       |                       |          |          |          |                  |                  |                  | 容重度90%           | 容重度91.45%        |                                             |                                             |
|                       |                       |          |          |          |                  |                  |                  | 容重度90%           | 容重度91.5%         |                                             |                                             |
| 6                     | 6(砂樣<br>F-3<br>1line) | 106/6/12 | 106/6/12 | 106/6/12 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 監造:陳芳瑛<br>許田;蔡政峰 | 容重度90%           | 容重度91.5%         | 07/3831/423<br>試驗結果:<br>33011771-0<br>試驗結果: |                                             |
|                       |                       |          |          |          |                  |                  |                  | 3%(最小含水量(8.7%)<) | 10.80%           |                                             |                                             |
|                       |                       |          |          |          |                  |                  |                  | 容重度90%           | 容重度91.5%         |                                             |                                             |

試製製作抗壓



續接器試體取樣

2016/02/28


厚度量測



## 附件8

### ●不合格施工缺失改善紀錄說明

例：主辦機關開立缺失之情況，監造單位缺失改善情況亦同。

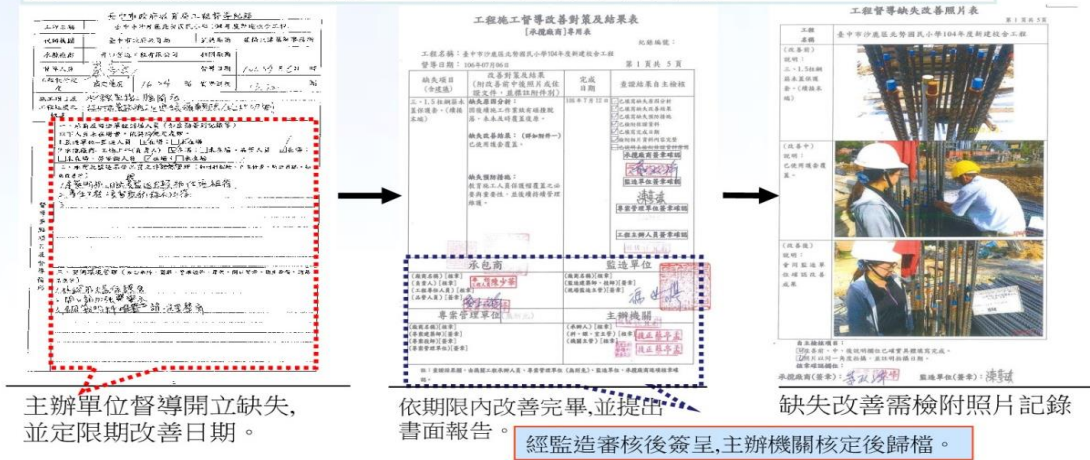

### ●查核缺失改善完成

**●查核缺失改善完成**

1. 混凝土表面殘留雜物如鐵絲、模板。2. 1F結構體施工混凝土面多處殘留鐵釘、鐵絲、鐵件或夾板。(L) (5.01.04)

**●查核缺失改善完成-主辦機關**

1. 本案為查核金額以上工程，主辦機關工程品質有關計劃書送審核備文件、工務協調會議紀錄、材料送審收發文件等紀錄建議彙整造冊。


2. 建議督導缺失項目可致明位置並附相片(如第三次督導之截水溝寬度不足)，如涉及立即危險性部分(如第二次督導-積水情形)應要求立即改善。(L) (4.01.04)

### ●施工檢試驗照片



## 附件9

### ●三級品質管理制度架構

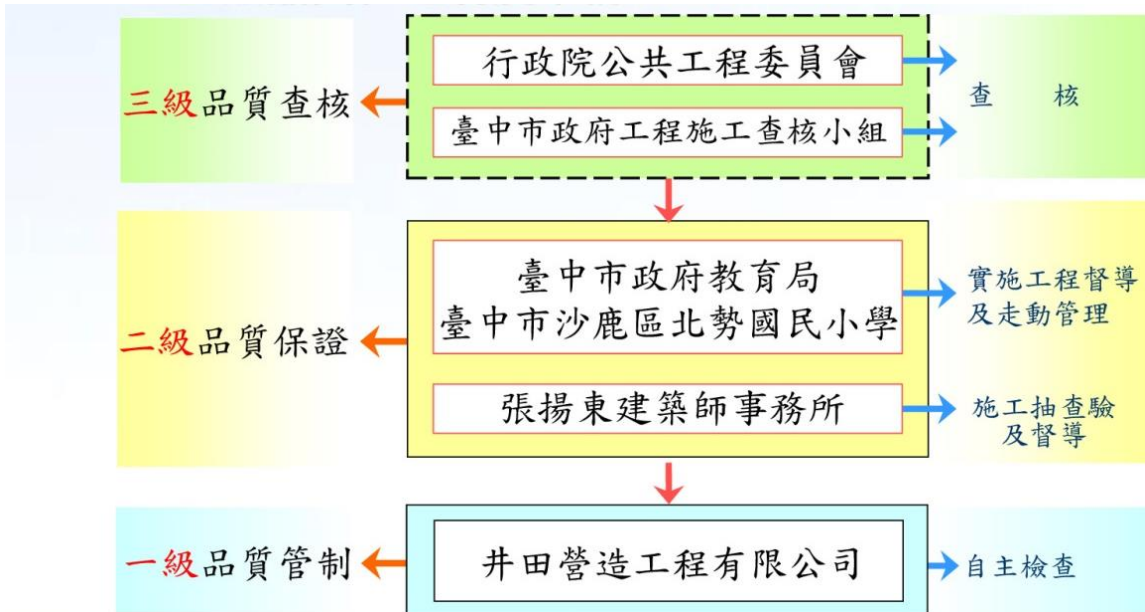

### ●承辦單位督導情形



### ●勞安環保督導



●計畫書核定情形

| 監造、品質、施工及安衛計畫 |           |                    |    |
|---------------|-----------|--------------------|----|
| 各項計畫書         | 核定日期      | 核定文號               | 備註 |
| 監造計畫書（第二版）    | 106年2月3日  | 中市教工字第1060006866號函 |    |
| 整體品質計畫書（第二版）  | 106年3月17日 | 中市教工字第1060021849號函 |    |
| 整體施工計畫書（第二版）  | 106年3月17日 | 中市教工字第1060021849號函 |    |
| 安全衛生計畫書（第二版）  | 106年3月17日 | 中市教工字第1060021849號函 |    |

副 本  
臺中市政府教育局 函

地址：43007臺中市豐原區瑞成路10號  
承辦人：陳文星  
電話：166-2238111(分機2238)  
電子郵件：tan3222@taichung.gov.tw

受文者：本局工程營繕科

發文日期：中華民國106年2月3日  
發文字號：中市教工字第1060006866號  
類別：普通函  
簽奉：本局營繕科長陳文星核辦  
附件：如說明三

主旨：有關貴事務所檢送「臺中市北勢國小104年度新建校舍工程」完成電力、電信、消防及修止後之監造計畫書等開工前應辦事項案，經審閱符合規定，本局同意核定，請查照。

說明：  
一、復貴所106年1月20日東建工字第106012001及106年1月23日東建工字第106012001號函。  
二、請管配得標廠商儘速開工，品質及勞工安全衛生計畫書送審，俟利便後開工事宜。  
三、隨函檢送自備監造計畫書，請監造單位擬定製作完稿後，分送主辦單位、代辦單位及得標廠商留存。

正本：監造計畫書核辦事項  
副本：臺中市北勢國民小學、臺中營造工程股份有限公司、本局工程營繕科

局長 彭富源

本局印信係由本局代辦處代為加印

監造計畫核定公文

副 本  
臺中市政府教育局 函

地址：43007臺中市豐原區瑞成路10號  
承辦人：陳文星  
電話：166-2238111(分機2238)  
電子郵件：tan3222@taichung.gov.tw

受文者：本局工程營繕科

發文日期：中華民國106年3月17日  
發文字號：中市教工字第1060021849號  
類別：普通函  
簽奉：本局營繕科長陳文星核辦  
附件：如說明二

主旨：有關「臺中市北勢國小104年度新建校舍工程」承辦送之整體品質計畫書(第二版)、整體施工計畫書(第二版)及勞工安全衛生計畫書(第二版)乙案，本局同意核定，請查照。

說明：  
一、復貴所106年3月10日東建工字第1060310-01、1060310-02號函。  
二、隨文檢送自備計畫書各一式1份，請管配承辦廠商以製作完稿本4份，各分送承商、監造單位、學校及代辦處留存。  
三、本署視辦費所審查符合，請確實督促承辦廠商自備計畫書所審施工品質及勞工安全衛生計畫，俾利工程。

正本：監造計畫書核辦事項  
副本：臺中市北勢國民小學、臺中營造工程股份有限公司、本局工程營繕科

局長 彭富源

施工、品質、職安計畫核定公文



## 附件11

## ●工程估驗計價、竣工驗收付款情形

保存年限：  
類 號：

工程營繕科  
張揚東建築師事務所 函

正本

地址：428 臺中市豐原區信義街192巷6號3樓  
電話：04-25152722 / 傳真：04-25150922  
沙鹿工廠內電話：04-20317295  
聯絡人：楊國隆 0935-477253

受文者：臺中市政府教育局(工程營繕科)

發文日期：中華民國107年1月30日  
發文字號：東建升字第1070130001號  
類別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：第三期估驗請款文件乙式3份

主旨：函轉「臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程」承商截至106年12月31日提請第三次估驗計價請款文件，詳如說明。

說明：依據承商升井工北字第1070119001號函附第三次估驗計價請款文件，經本所辦理審查作業，尚符契約估驗款規定，依約轉請貴局辦理後續審核程序。

正本：臺中市政府教育局(工程營繕科)  
副本：升井營造工程有限公司、臺中市沙鹿區北勢國民小學  
本事務所(存查)

工程營繕科 收文:1070131

臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程

第三期工程估驗請款(106.10.1-106.12.31)

主辦機關：臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程  
代辦機關：臺中市政府教育局  
監造單位：張揚東建築師事務所  
承攬廠商：升井營造工程有限公司

一 〇 七 年 一 月

正 本  
臺中市政府教育局 函

地址：428007臺中市豐原區信義街192巷6號3樓  
承辦人：楊國隆  
電話：04-25152722 / 傳真：04-25150922  
電子信箱：tai0228@taichung.gov.tw

408  
臺中市沙鹿區中山路100-12號

受文者：升井營造工程有限公司

發文日期：中華民國107年8月7日  
發文字號：中教工字第107006778號  
類別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如左

主旨：檢送107年7月25日「臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程」初驗紀錄(建築工程)乙份，請承包商於107年8月25日前改善完成所列缺失，並同時將相關缺失改善資料(含照片)報告函(副知本局)送「監造單位」簽章查驗確認改善無誤後，送本局憑辦後續驗收事宜，請查照。

說明：  
一、依據政府採購法第71條及本工程契約第15條規定辦理。  
二、檢附本局「初驗缺失改善對策及結果表」與「初驗缺失改善照片表」格式文件各一份。  
三、本次驗收結果與契約規定不符項目，若廠商認為不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，擬不進行改善，申請減價收受者，廠商需於紀錄所訂改善期限前7日提出相關說明資料函送監造單位檢附審核符合契約規定，並核算減價收受之契約價金及違約金後，始得函報本局申辦減價收受及複驗等事宜。

正本：張揚東建築師事務所、升井營造工程有限公司  
副本：李委員明德(含附件)、臺中市沙鹿區北勢國民小學、本局工程營繕科

局長 彭 富 源

臺中市政府教育局[工程驗]請款文件檢查表

工程名稱：臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程  
請款期(次)別：第03期(第1次)

| 項次 | 需審查項目                                     | 監造單位審查結果    | 備註          |
|----|-------------------------------------------|-------------|-------------|
|    |                                           | 已<br>驗<br>畢 | 未<br>驗<br>畢 |
| 1  | 審查紀錄表                                     | ✓           |             |
| 2  | 工程請款單                                     | ✓           |             |
| 3  | 請款計價單                                     |             | ✓           |
| 4  | 工程詳細表(總表)                                 | ✓           |             |
| 5  | 工程詳細表(明細表)                                | ✓           |             |
| 6  | 數量計算表(表)                                  | ✓           |             |
| 7  | 物價指數調整工程說明細表                              |             | 本票無         |
| 8  | 請款計價說明                                    |             | ✓           |
| 9  | 監造報告                                      | ✓           |             |
| 10 | 施工目錄                                      | ✓           |             |
| 11 | 施工照片(以施工時價項目代表性照片為主，其他施工過程照片可彙集光碟並附於請款文件) | ✓           |             |
| 12 | 材料驗(試)驗報告                                 | ✓           |             |
| 13 | 前期付款資料                                    |             | ✓           |
| 14 | 分期付款表                                     |             | ✓           |
| 15 | 保險資料(檢驗第一期及驗收)                            |             | ✓           |
| 16 | 管理處產物資料                                   |             | ✓           |

備註：檢查結果已檢附者註明「○」，未檢附者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」

監造單位：

工程估驗審查紀錄表

估驗期別：第03期  
廠商送審日期：106年01月18日

| 工程名稱     | 臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程                                                                                                                                                                                                                                    | 合約金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86,920,000元                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 工程地點     | 臺中市沙鹿區 承包廠商 升井營造工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                     | 簽約機關                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 臺中市沙鹿區北勢國民小學                         |
| 開工日期     | 106年3月9日                                                                                                                                                                                                                                                   | 監造單位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 張揚東建築師事務所                            |
| 工程期限     | 405日曆天                                                                                                                                                                                                                                                     | 實際進度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52.19%                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 估驗進度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40.37%                               |
| 工作內容     | 1.假設工程<br>2.結構工程完成<br>3.一、二樓內牆及平頂粉刷<br>4.機電管線及接駁工程<br>5.一、二樓部分門窗<br>6.一、二樓平頂批土                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| 監造單位查驗情形 | 1.工程計價是否依約(按月)列計。<br>2.前期估驗單金額與估驗單。<br>3.請款估驗進度是否未超過實際工程進度。<br>4.請款數量未超過日報表數量。<br>5.估驗請款單頁數與內頁金額合計一致。<br>6.承包商簽章是否符規定。<br>7.工程進度未落後10%。<br>8.結構安全否。<br>9.檢附施工照片符合規定。<br>10.現場施工是否設計、施工圖說、施工規範等相符。<br>11.估驗書中所附相關測試報告符合契約暨相關法令規定。<br>12.前期/本期估驗請款是否須辦理物價調整。 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 監造單位審核結果<br>(建築師審核章)<br>審核合格<br>退回更正 |
| 代辦機關審核查閱 | 1.確認監造單位估驗審查紀錄是否可付款。<br>2.估驗文件份數是否齊備。<br>3.確認單頁內頁金額合計一致。<br>4.各單項之累計數量與總體檢核未有超過約量的數量。<br>5.與前期估驗單金額無誤。<br>6.保留款是否已辦理扣回。                                                                                                                                    | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 代辦機關<br>(審核章對核章)<br>核核符合<br>修正<br>修正 |

正 本  
臺中市政府教育局 函

地址：428007臺中市豐原區信義街192巷6號3樓  
承辦人：楊國隆  
電話：04-25152722 / 傳真：04-25150922  
電子信箱：tai0228@taichung.gov.tw

408  
臺中市沙鹿區中山路100-12號

受文者：張揚東建築師事務所

發文日期：中華民國107年10月3日  
發文字號：中教工字第1070065509號  
類別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如左

主旨：檢送107年10月2日「臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程」正式驗收紀錄乙份，請承包商於107年10月17日前改善完成所列缺失，並同時將相關缺失改善資料(含照片)報告函(副知本局)送「監造單位」簽章查驗確認改善無誤後，送本局憑辦後續驗收事宜，請查照。

說明：  
一、依據政府採購法第71條及本工程契約第15條規定辦理。  
二、檢附本局「驗收缺失改善對策及結果表」與「驗收缺失改善照片表」格式文件各一份。  
三、本次驗收結果與契約規定不符項目，若廠商認為不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，擬不進行改善，申請減價收受者，廠商需於紀錄所訂改善期限前7日提出相關說明資料函送監造單位檢附審核符合契約規定，並核算減價收受之契約價金及違約金後，始得函報本局申辦減價收受及複驗等事宜。

正本：張揚東建築師事務所、升井營造工程有限公司  
副本：臺中市沙鹿區北勢國民小學、本局工程營繕科

局長 彭 富 源

第1頁 共2頁

## 附件12

### ●公共藝術設計計劃及民眾參與照片

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>設置計畫書</p> <p>臺中市沙鹿區北勢國民小學 104 年度新建校舍工程<br/>公共藝術設置計畫書</p>  <p>興辦機關：臺中市沙鹿區北勢國民小學<br/>提送日期：106 年 12 月 22 日(修正版)</p> | <p>臺中市沙鹿區北勢國民小學 104 年度<br/>新建校舍工程<br/>公共藝術徵選結果報告書</p>  <p>興辦機關：臺中市沙鹿區北勢國民小學<br/>提送日期：107 年 5 月 21 日</p> | <p>臺中市沙鹿區北勢國民小學 104 年度<br/>新建校舍工程<br/>公共藝術完成報告書</p>  <p>興辦機關：臺中市沙鹿區北勢國民小學<br/>提送日期：107 年 11 月 20 日</p> |
| <p>作品設置前照片</p>                                                                                                     | <p>作品設置後照片</p>                                                                                         | <p>驗收照片</p>                                                                                           |
| <div data-bbox="300 1227 1294 1933"> <p>成果團體照</p> <p>作品全區圖</p> <p>民眾參與計畫</p> <p>作品介紹</p> <p>彩繪活動</p> <p>作品講解</p> <p>彩繪活動成果發表</p> <p>台中市沙鹿區北勢國民小學公共藝術導覽手冊</p> <p>名稱：強棒出擊</p> </div>                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |



## 附件13

### ●工程圍籬響應花博標語



### ●平等樓命名票選活動

### ●綠建築標章

#### 臺中市沙鹿區北勢國民小學校舍大樓命名活動辦法

##### 一、活動緣起

本校新建校舍於前任與現任校長及全體教職員工、家長共同努力下，即將順利竣工啟用。校園建築是學校文化的有形載體，校舍建築除了新穎完善之外，更應富含教化意涵，方能發揮其潛移默化之教化功能。如能融入學校歷史文化、經營理念、時代脈動、科技人文、核心素養等元素，賦予「正面意涵」之名稱，既可發揮啟迪人心之功效，亦能營造優質的校園文化氛圍，達到陶冶情操、培養人格之教育目標。

##### 二、活動宗旨

(一) 為新建校舍大樓命名，藉由本活動凝聚本校全體師生向心力，激發愛校興校、同心共榮之情懷。

(二) 展現校園建築新氣象，積極營造樂觀進取、卓越創新的校園文化。

(三) 透過徵集活動，廣邀教職員工及學生共同參與，擴大活動層面。

(四) 藉由全校公開票選，增進學生的參與及認同感，深化學生民主素養。

##### 三、主辦單位：本校輔導室。

四、協辦單位：本校家長會、教務處、學務處、總務處。

五、評審委員會：由校長、家長會會長、教務主任、學務主任、總務主任、輔導主任。

及教師會理事長共七位委員組成。

六、活動對象：本校教職員工、學生、家長。

