

「臺中市學校教室冷氣設備裝設採購案」說明會手冊

目錄

1100430 版本

一、採購履約執行期程.....	2
二、校內簽辦範本.....	3
(一) 擇定本校履約廠商簽呈(學校端填寫).....	3
(二) 現勘及需求調查紀錄表(學校端填寫).....	4
(三) 各校辦理試運轉測試程序簽呈(學校端填寫).....	5
(四) 試運轉佐證資料(學校端填寫).....	6
三、臺中市中小學教室冷氣設備裝設辦理時程調查表.....	7
★★★調查表填報網址 https://reurl.cc/pmbAdd	
四、附件參考資料	
附件一：財物採購契約-1100302.....	另附
附件二：採購規格及施工規範-1100302.....	另附
附件三：冷氣安裝教室數量表.....	另附
附件四：中小學教室冷氣設備裝設採購案說明會(0120 版)	另附
附件五：得標廠商聯繫資料(0503 版)	另附
★★★說明會文件下載網址 http://www.tc.edu.tw/m/1132	

一、採購履約執行期程(學校端行政作業程序與相關日期參考範例)



備註：以上日期僅供各校履約執行參考之用

二、校內簽辦範本

(一) 擇定本校履約廠商簽呈(學校端填寫)

簽

於總務處

中華民國 110 年○○月○○日

主旨：為辦理「臺中市學校教室冷氣設備裝設採購案」(以下簡稱本案)擇定本校履約廠商相關事宜，詳如說明，簽請核示。

說明：

- 一、依據本府教育局 110 年 4 月 14 日中市教小字第 1100024255 號函辦理。
- 二、查本案經費由教育部補助，依上述來函附件，本校受核定新設冷氣設備 A 台、舊有冷氣設備汰換 B 台，總補助 A+B 台。其中一般教室(使用 7KW 以上機型)冷氣 X 台、西曬及頂樓教室(使用 8KW 以上機型)冷氣 Y 台，皆非【為】冷暖氣機型。
- 三、次查本案教育局係委託沙鹿區北勢國民小學代為辦理招標作業，經公開招標最有利標決標，併以複數決標擇定 5 家得標廠商分別為：大同綜合訊電股份有限公司、禾聯電器股份有限公司、台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司、東元電機股份有限公司、台灣松下銷售股份有限公司。
- 四、本校為需求機關，經評估各廠商產品規格、品質及履約效能，擬擇定○○○○○○公司為本校履約廠商。

擬辦：奉 鈞長核可後，由總務處辦理本案後續作業相關事宜。

會辦單位：會計主任

(二) 現勘及需求調查紀錄表(學校端填寫)

「臺中市學校教室冷氣設備裝設採購案」

學校端現勘及需求調查紀錄表

填表日期：110年○○年○○日

學 校 名 稱		本 校 聯 絡 人 員	(學校代表人員務必親簽)
		E m a i l 信 箱	
		聯 絡 電 話	
現勘日期	110年○○年○○日	現勘人員(廠商)	(廠商代表人員)
本校需求數量(請依本採購案招標文件-冷氣安裝教室數量表資料核實填列)			
一般教室冷氣(台數)		○○台	
西曬及頂樓教室冷氣(台數)		○○台	
冷暖機型(台數)		○○台	
合計		○○台	
學校建議或廠商需配合事項			
一、學校需求建議描述……			

備註：完成填表後正本交由廠商帶回，學校影本自存。

(三) 各校辦理試運轉測試程序簽呈(學校端填寫)

簽

於總務處

中華民國 110 年○○月○○日

主旨：為辦理「臺中市學校教室冷氣設備裝設採購案」本校履約廠商執行試運轉測試程序相關事宜，詳如說明，簽請核示。

說明：

- 一、依據「臺中市學校教室冷氣設備裝設採購案」財物採購契約第十二條辦理。(詳如本案契約書面資料)
- 二、本校履約廠商○○○○○○公司已於 110 年○○年○○日開始入校施工，依照本案契約第十二條第三項之規定，廠商應就履約標的於冷氣機安裝教室(場所)、完成安裝後報竣工前(期間)及各校有權代表人會同(條件)下辦理試車、試運轉或試用測試程序，以作為查驗或驗收之用。


擬辦：

- 一、敬請 鈞長派員擔任本校有權代表人。
- 二、奉核後，通知相關人員依規(約)辦理試運轉程序相關事宜。

會辦單位：會計主任

臺中市中小學教室冷氣設備裝設辦理時程調查表

調查表填報網址 <https://reurl.cc/pmbAdd>

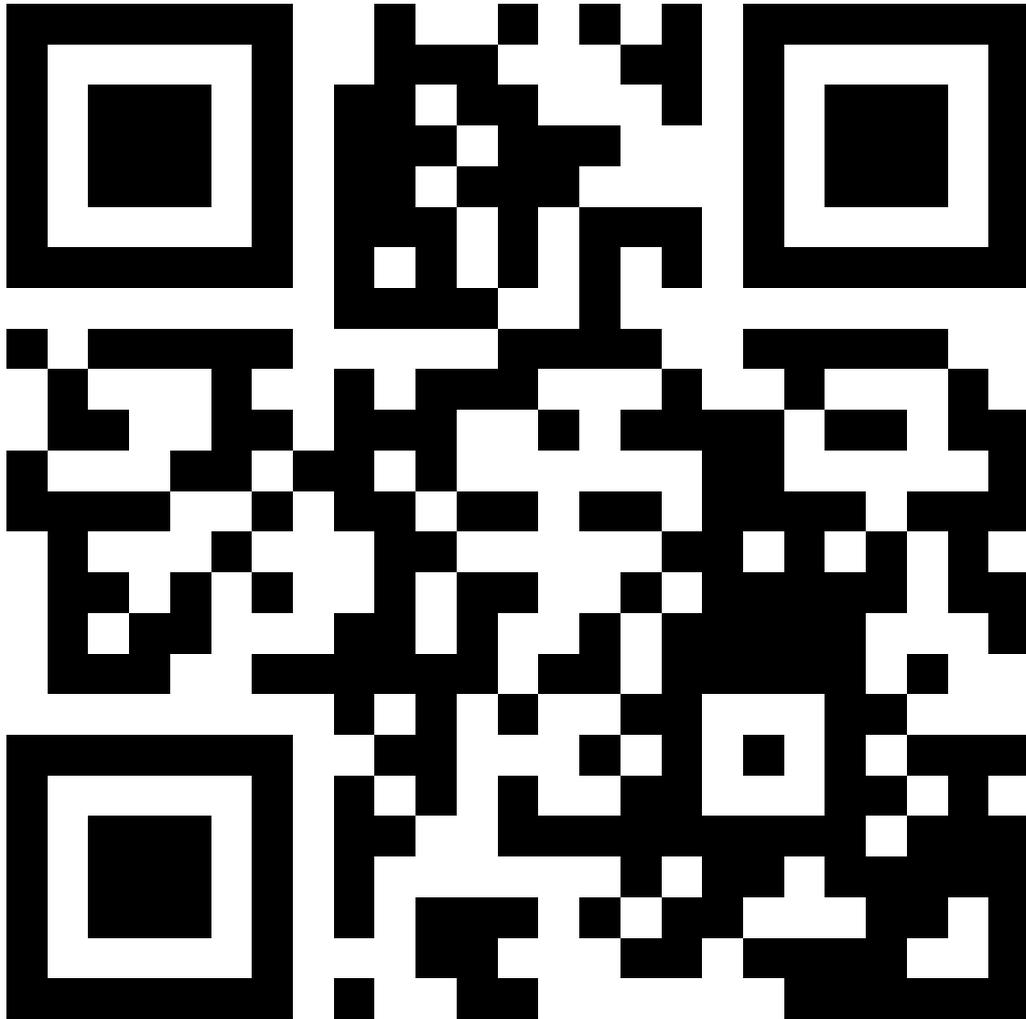

臺中市中小學教室冷氣設備裝設辦理時程調查表

調查表填報網址 <https://reurl.cc/pmbAdd>

【調查表範例-填報頁面 1】



臺中市中小學教室冷氣設備裝設辦理時程調查表

各位夥伴 大家好!

本調查表共分為三個區段，請您依序詳實填表，感謝您的配合。

- 1.第一區段：學校基本資料
- 2.第二區段：電力工程及冷氣安裝期程
- 3.第三區段：學校下訂廠商及裝機聯絡人資料

***必填**

行政區 *

選擇 ▼

繼續

請勿利用 Google 表單送出密碼。

Google 並未認可或建立這項內容。 [檢舉濫用情形](#) - [服務條款](#) - [隱私權政策](#)

Google 表單

臺中市中小學教室冷氣設備裝設辦理時程調查表

調查表填報網址 <https://reurl.cc/pmbAdd>

【調查表範例-填報頁面 2】

臺中市中小學教室冷氣設備裝設辦理時程調查表

*必填

西區

臺中市中小學教室冷氣設備裝設辦理時程調查表

行政區	學校代碼	學校名稱	新設冷氣 (台數)	舊有汰換 (台數)	一般教室冷氣 (台數)	西曬及頂樓 教室冷氣 (台數)	冷暖機型 (台數)
西區	193301	臺中女中	0	0	0	0	0
西區	193303	忠明高中	0	69	69	0	0
西區	193501	居仁國中	0	0	0	0	0
西區	193509	光明國中	156	0	88	68	0
西區	193510	向上國中	56	0	56	0	0
西區	193608	忠孝國小	202	0	118	84	0
西區	193609	忠信國小	36	0	36	0	0
西區	193610	大同國小	148	8	16	140	0
西區	193611	忠明國小	98	0	98	0	0
西區	193612	中正國小	92	6	74	24	0
西區	193644	大勇國小	202	0	60	142	0

學校名稱 *

選擇

臺中市中小學教室冷氣設備裝設辦理時程調查表

調查表填報網址 <https://reurl.cc/pmbAdd>

【調查表範例-填報頁面 3】

臺中市中小學教室冷氣設備裝設辦理時程調查表

*必填

電力工程及冷氣安裝期程

- 電腦版可直接點選google內建日曆點選日期
- 手機版須自行輸入日期

新設電力工程預計完工日

- 電腦版可直接點選google內建日曆點選日期,手機版須自行輸入日期

日期

年 / 月 / 日

冷氣機預計安裝起始日(契約施工日為90日曆天,且應於12/31前完工,故限填10/1前之日期)*

- 電腦版可直接點選google內建日曆點選日期,手機版須自行輸入

日期

年 / 月 / 日

冷氣機預計安裝起始日限填 10/1 前之日期

臺中市中小學教室冷氣設備裝設辦理時程調查表

調查表填報網址 <https://reurl.cc/pmbAdd>

【調查表範例-填報頁面 4】

學校下訂廠商及裝機聯絡人資料

學校預計下訂之廠商(按照廠商簡報出場序) *

- 1.大同綜合訊電股份有限公司
- 2.禾聯電器股份有限公司
- 3.台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司
- 4.東元電機股份有限公司
- 5.台灣松下銷售股份有限公司

裝機校方聯絡人 *

您的回答

聯絡人職稱 *

您的回答

聯絡人手機或學校電話分機 *

範例：0910-123455 或 25123445 分機112

您的回答

臺中市中小學教室冷氣設備裝設辦理時程調查表

調查表填報網址 <https://reurl.cc/pmbAdd>

【調查表範例-填報頁面 5】



臺中市中小學教室冷氣設備裝設辦理時程 調查表

感謝您撥冗協助填表，讓工作進行得更圓滿，萬分感恩！

返回

提交

請勿利用 Google 表單送出密碼。

確認貴校填報資料無誤

可按下【提交】按鈕完成填報

「臺中市學校教室冷氣設備裝設採購案」說明會手冊

文件下載網址 <http://www.tc.edu.tw/m/1132>

